Kominiarstwo
Marcin Komorowski
58-350 Mieroszów, Unisław Śl. 16A
NIP: 886-273-16-45 Regon: 020452620
Tel: 515 157 574

Wrocław dnia 06.10.2026

„ATENA&HJW" Sp. z o.o.
Ul. Ołbińska 6
50 – 237 Wrocław

Informacja kominiarska


Po przeprowadzonej kontroli w budynku przy ul. Św. Wincentego 15, w lokalu użytkowym na parterze, Kominiarstwo Marcin Komorowski stwierdza, że istniejące przewody wentylacyjne w lokalu zostały zasypane gruzem i zalane betonem na wyższych kondygnacjach. W związku z brakiem możliwości udrożnienia przewodów kominowych od strony lokalu i konieczności rozkucia ścian w mieszkaniach na wyższych kondygnacjach, należy:

- Odłączyć istniejącą wentylację Sali lokalu od niedrożnego przewodu kominowego nr 42 (zamurować otwór) i po usunięciu kabli antenowych podłączyć do przewodu kominowego nr 1(szkic na odwrocie)
- Odłączyć istniejącą wentylację WC lokalu od niedrożnego przewodu kominowego nr 23 (zamurować otwór) i podłączyć do przewodu kominowego nr 24 (szkic na odwrocie)

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Komorowski
Nr uprawnień 10803

ZATWIERDZAM ZAKRES PRAC ZAWARTYCH W „INFORMACJI KOMINIARSKIEJ"

Św. Wincentego 15 - szkic przewodów kominowych na dachu

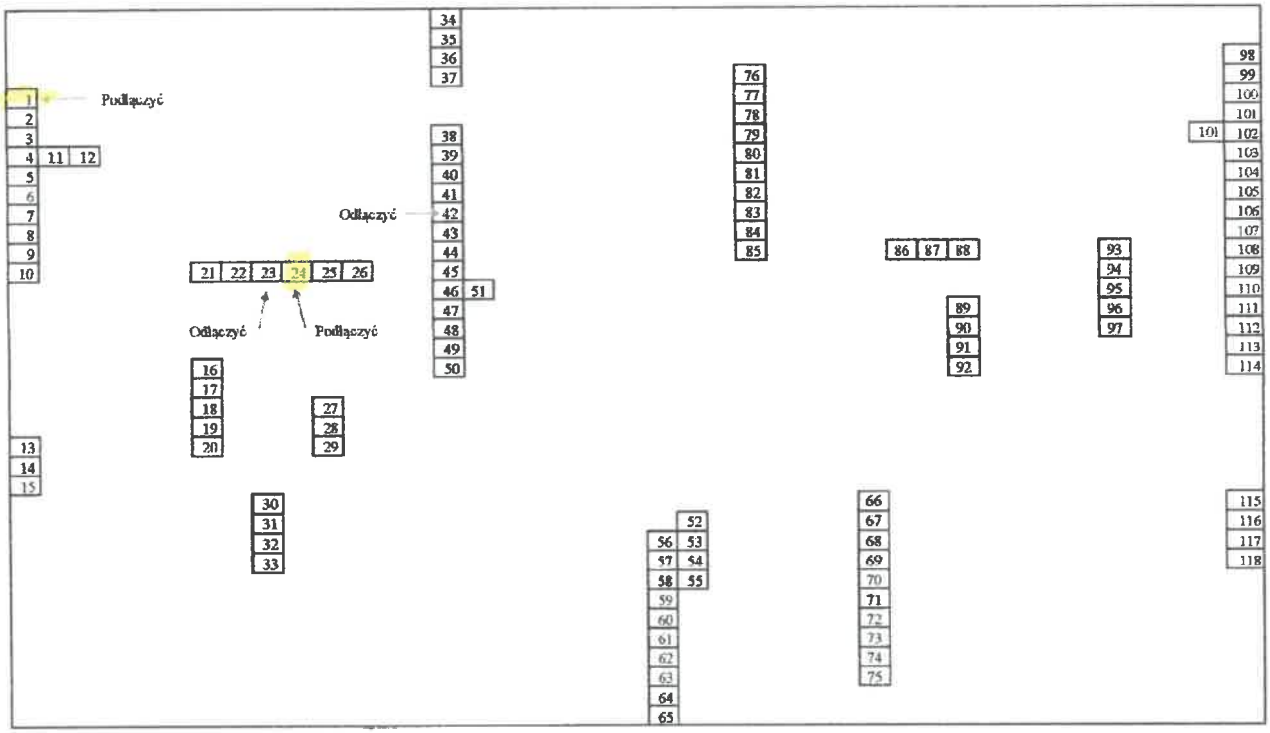

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI
Marcin Komorowski
Nr uprawnień 10803
